



MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILI



E.N.A.C.
ENTE NAZIONALE per
L'AVIAZIONE CIVILE

Committente Principale



AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIRENZE - "AMERIGO VESPUCCI"

Opera

MASTERPLAN AEROPORTUALE 2035

Titolo Documento Completo

CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA
Cronoprogramma


Livello di Progetto

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

LIV	REV	DATA EMISSIONE	SCALA	CODICE FILE COMPLETO
PFTE	00	Ottobre 2022	-----	FLR-MPL-PFTE-CAN1-002-SC-CR_Crono
				TITOLO RIDOTTO
				Crono

00	10/2022	Prima Emissione	TAE + Architector engineering	DONATA VESTRINI	L. TENERANI
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

COMMITTENTE PRINCIPALE	PROGETTAZIONE	SUPPORTI SPECIALISTICI
 ACCOUNTABLE MANAGER Dott. Vittorio Fanti	 DIRETTORE TECNICO Ing. Lorenzo Tenerani Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara n°631	PROGETTAZIONE SPECIALISTICA Ing. Donata Vestrini Ordine degli Ingegneri di Firenze n° 6703
POST HOLDER PROGETTAZIONE AD INTERIM Dott. Vittorio Fanti	RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Donata Vestrini Ordine degli Ingegneri di Firenze n° 6703	SUPPORTO SPECIALISTICO Ing. Santi Caminiti Ordine degli Ingegneri di Messina n°1131
POST HOLDER MANUTENZIONE Ing. Nicola D'Ippolito		
POST HOLDER AREA DI MOVIMENTO Geom. Luca Ermini		

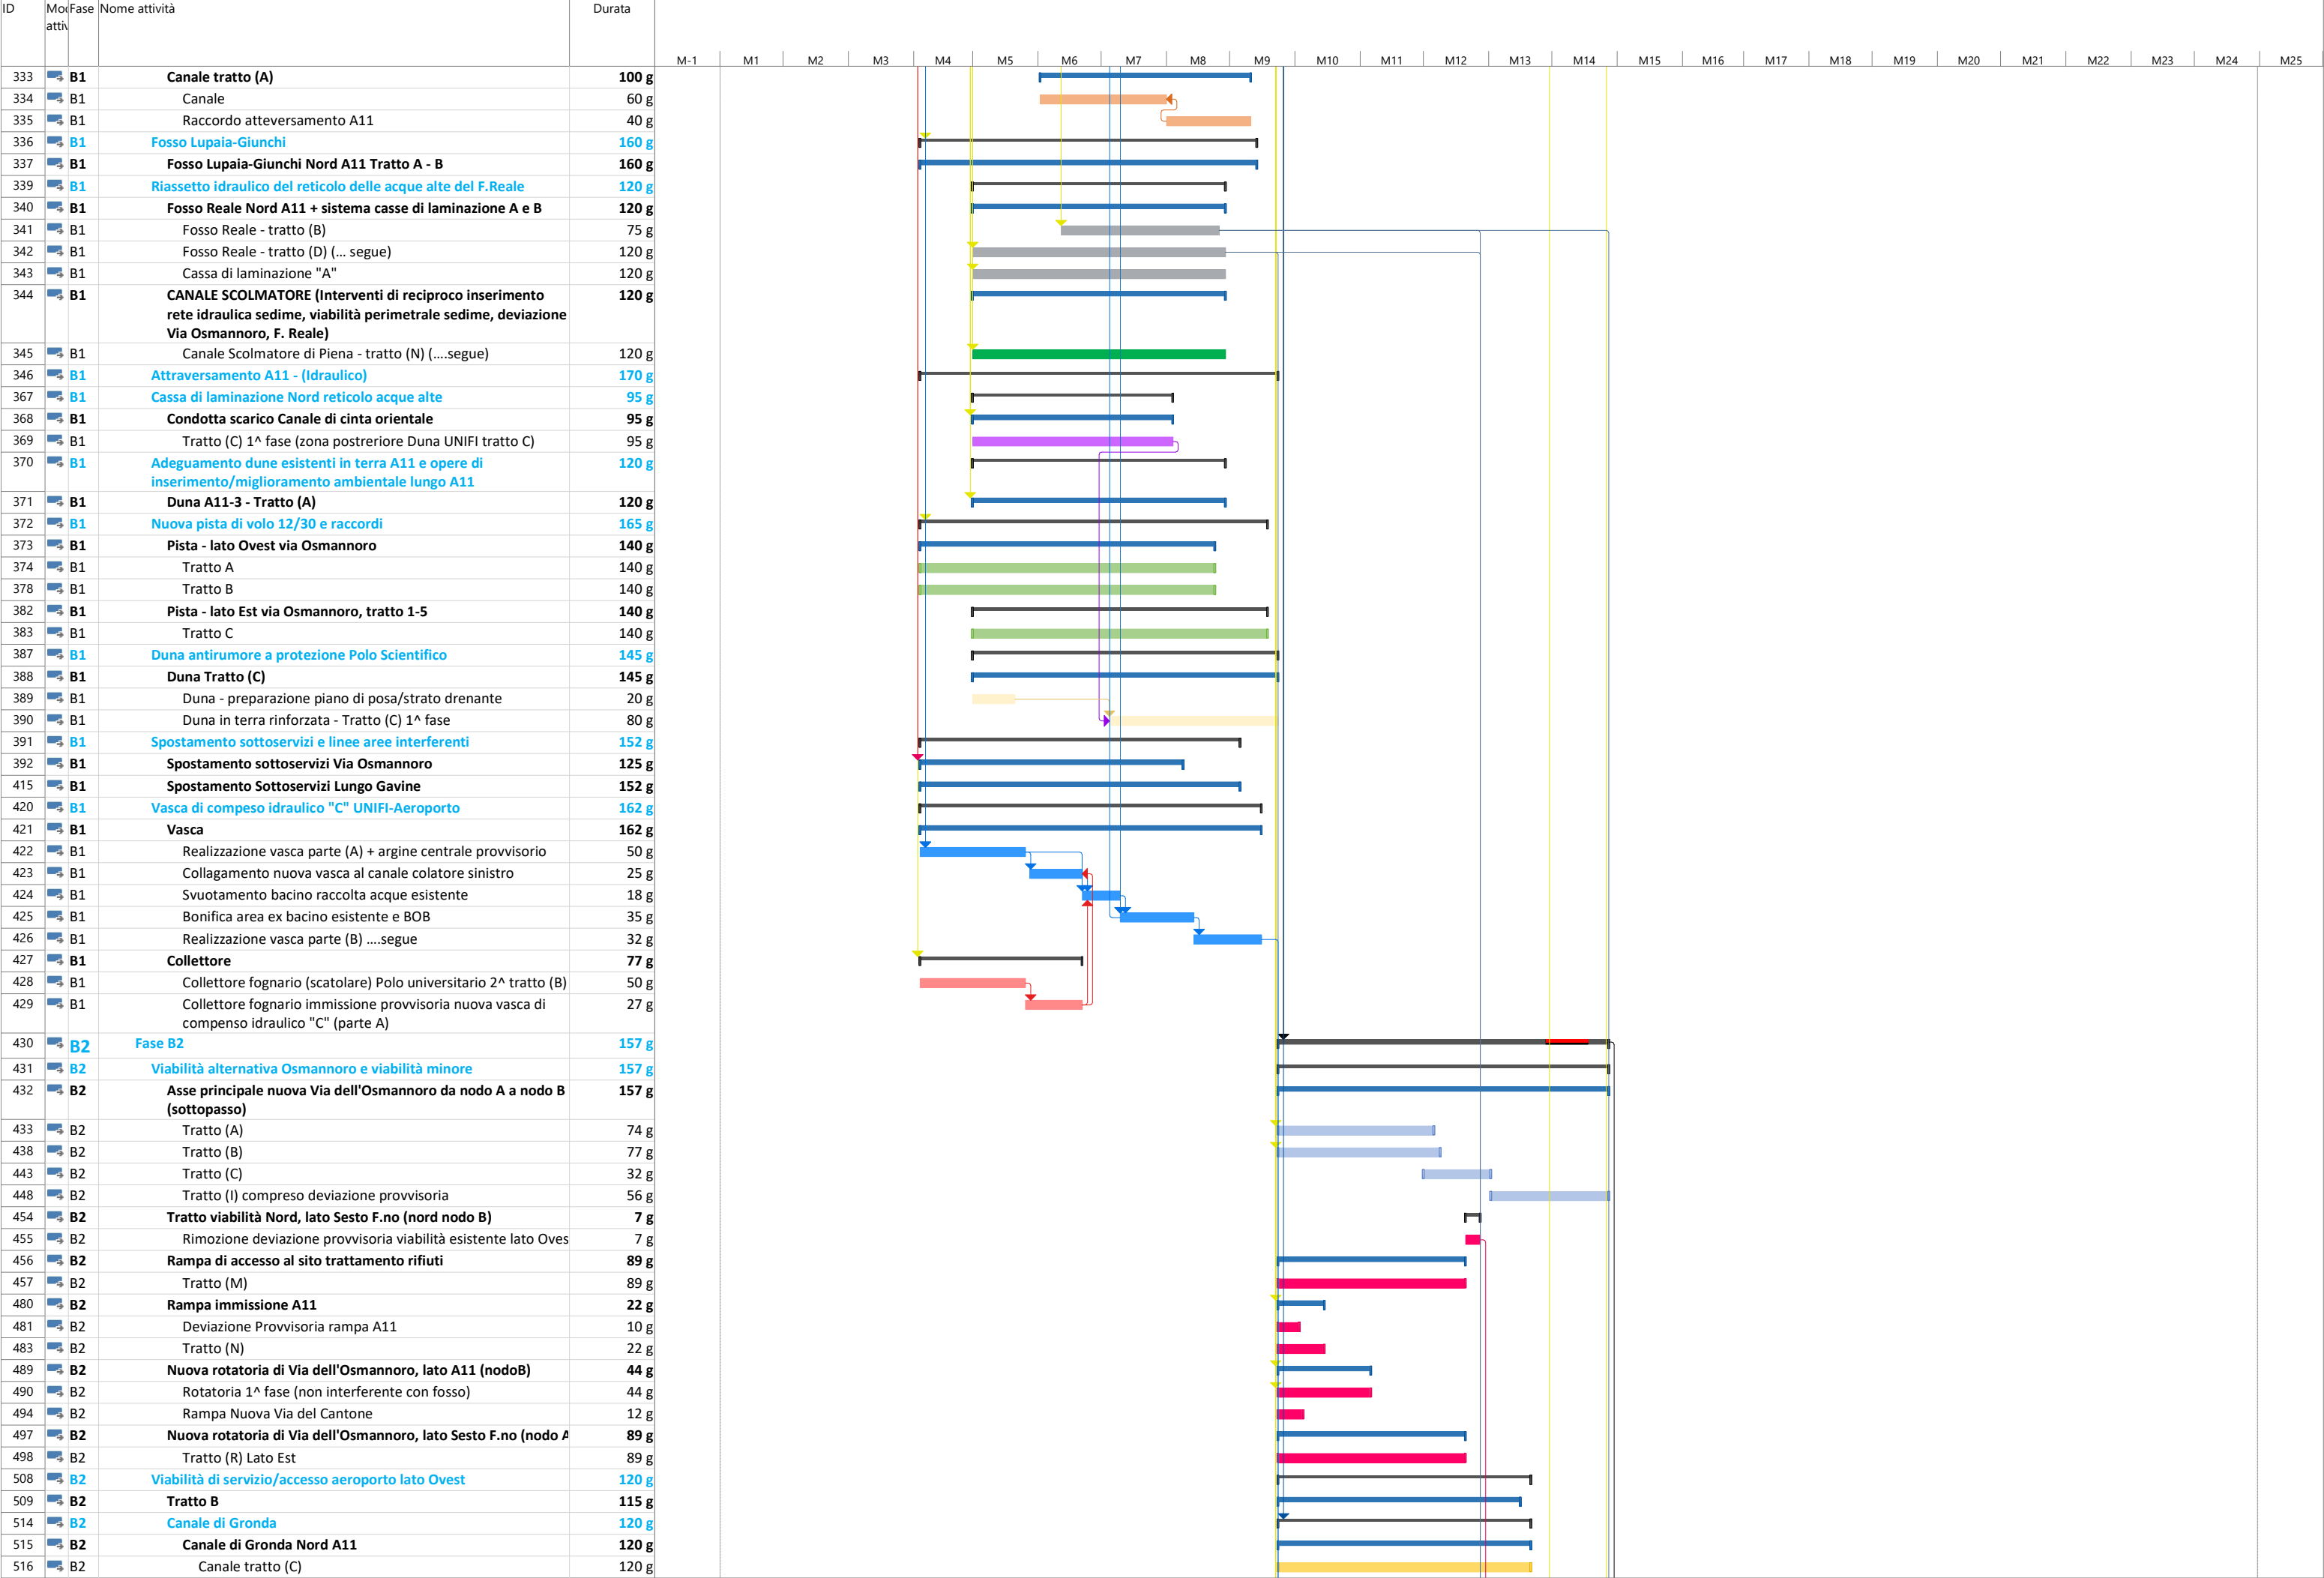

MoxFase																													
attivi		Nome attività	Durata	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25
520		B2	Riassetto idraulico del reticolo delle acque alte del F.Reale	157 g																									
521		B2	Svuotamento Habitat bonifica fondale e BOB	20 g																									
522		B2	Svuotamento Habitat bonifica fondale e BOB	20 g																									
523			Allestimento deposito internedio terre	5 g																									
524		B2	Fosso Reale Nord A11 + sistema casse di laminazione A e B	149 g																									
525		B2	Fosso Reale - tratto (C)	15 g																									
526		B2	Fosso Reale - tratto (D) (... compelatmento mantellata)	140 g																									
527		B2	Cassa di laminazione "B"	80 g																									
528		B2	CANALE SCOLMATORE (Interventi di reciproco inserimento rete idraulica sedime, viabilità perimetrale sedime, deviazione Via Osmannoro, F. Reale)	88 g																									
529		B2	Canale Scolmatore di Piena - tratto (M)	88 g																									
534		B2	Canale Scolmatore di Piena - tratto (N) (.... Completamento mantalleta)	72 g																									
535		B2	Fosso Reale adeguamento Sud A11	140 g																									
536		B2	Adeguamento argini esistenti canale scolmatore - tratto (V)	140 g																									
540		B2	Cassa di laminazione Nord reticolo acque alte	20 g																									
541		B2	Condotta scarico Canale di cinta orientale	20 g																									
542		B2	Tratto (B) 1^ tratto non interferente habitat	20 g																									
543		B2	Adeguamento dune esistenti in terra A11 e opere di inserimento/miglioramento ambientale lungo A11	70 g																									
544		B2	Duna A11-3 - Tratto (B)	70 g																									
545		B2	Nuova pista di volo 12/30 e raccordi	150 g																									
546		B2	Pista - lato Ovest via Osmannoro	150 g																									
547		B2	Tratto A	150 g																									
549		B2	Tratto B	120 g																									
551		B2	Pista - lato Est via Osmannoro, tratto 1-5	149 g																									
552		B2	Tratto C	148 g																									
556		B2	Tratto D	80 g																									
560		B2	Raccordi + upgrade Piazzale W	77 g																									
561		B2	Tratto P	45 g																									
565		B2	Strada perimetrale Aeroporto provvisoria	32 g																									
571		B2	Duna antirumore a protezione Polo Scientifico	65 g																									
572		B2	Duna Tratto (B)	65 g																									
575		B2	Spostamento sottoservizi e linee aree interferenti	139 g																									
576		B2	Spostamento sottoservizi Via Osmannoro	139 g																									
594		B2	Vasca di compeso idraulico "C" UNIFI-Aeroporto	70 g																									
595		B2	Vasca	70 g																									
596		B2	Realizzazione vasca parte (B)	55 g																									
597		B2	Rimozione argine centrale provvisorio e unificazione/completamento vasca Parti (A) e (B)	15 g																									
598		B2	Collettore	15 g																									
599		B2	Collettore fognario (scatolare) immissione definitiva nuova vasca di compenso idraulico "C"	15 g																									
600		B3	Fase B3	134 g																									
601		B3	Viabilità alternativa Osmannoro e viabilità minore	129 g																									
602		B3	Asse principale nuova Via dell'Osmannoro da nodo A a nodo B (sottopasso)	104 g																									
603		B3	Tratto (D)	104 g																									
608			Tratto E	45 g																									
613		B3	Nuova rotatoria di Via dell'Osmannoro, lato A11 (nodoB)	47 g																									
614		B3	Rotatoria 2^ fase (completamento) Tratto (L)	47 g																									
621		B3	Nuova rotatoria di Via dell'Osmannoro, lato Sesto F.no (nodo A	95																									

